

SEHi Aktuell 15. Mai 2026

Alter Markt/Mühlenstraße – Kanalbaumaßnahmen

Aktueller Bauabschnitt 1 (BA1)

Im südlichen Teil der Mühlenstraße werden abschließende Arbeiten an Versorgungsleitungen ausgeführt. Anschließend wird der Straßenbau vorbereitet.

Für die Arbeiten und für die Baustelleneinrichtungsfläche ist die Mühlenstraße von St. Magdalenen bis zur Einmündung Dammstraße sowie der Bereich vor den Grundstücken Alter Markt 38 und Ritterstraße 11 gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Fahrbahn der Dammstraße ist im Bereich der Einmündung Mühlenstraße weiterhin eingengt. Der Verkehr wird auf zwei Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.

Aktueller Bauabschnitt 2 (BA2)

In der Ritterstraße werden Arbeiten an Versorgungsleitungen ausgeführt. Anschließend wird der Straßenbau vorbereitet.

Dafür ist die Ritterstraße vom Grundstück 1A bis zur Einmündung Bergmannstraße gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim halbseitig gesperrt.

Bauabschnitt 3 (BA3)

Vom südlichen Teil der Straße Alter Markt wird in Richtung der Einmündung Süsternstraße der Regenwasserkanal gebaut und die Hausanschlüsse werden erneuert. Nach Abschluss der Kanalarbeiten folgen Arbeiten der EVI Energieversorgung Hildesheim und der Stadt Hildesheim.

Bauabschnitt 4 (BA4)

Der vierte Bauabschnitt erstreckt sich von der Höhe der Grundstücke Alter Markt 35 und 44 bis zur Kreuzung Burgstraße. Im ersten Schritt wird der neue Regenwasserkanal gebaut und danach werden die Hausanschlüsse erneuert. Nach Abschluss der Kanalarbeiten folgen Arbeiten der EVI Energieversorgung Hildesheim und der Stadt Hildesheim.

Darauf sollte man sich einstellen

Für die Kanalsanierung in offener Bauweise, das Verlegen der Versorgungsleitungen und den grundhaften Ausbau der Fahrbahn müssen die Straßen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Die verkehrsbehördliche Anordnung der Stadt Hildesheim legt den zu sperrenden Abschnitt und das Aufstellen von Sonderverkehrszeichen fest. Umleitungen werden ausgeschildert sein. Die Gehwege bleiben weitestgehend nutzbar.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.



Das jeweils gesperrte Baufeld darf nur mit Genehmigung der Stadt Hildesheim befahren werden. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich dafür frühzeitig an den Ansprechpartner der Stadt Hildesheim wenden: Carsten Bode, Telefon 05121 301-3611, c.bode@stadt-hildesheim.de.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen, archäologische Funde oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

Darum wird gebaut

Die Stadt Hildesheim, die Stadtentwässerung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim führen eine gemeinsame Baumaßnahme in Teilen der Straßen Alter Markt und Ritterstraße sowie in der gesamten Mühlenstraße durch. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis ins Jahr 2028 dauern.

Die Stadtentwässerung Hildesheim baut rund 310 Meter neuen Regenwasserkanal, der das Oberflächenwasser von den vorderen Dachhälften der Gebäude und von der Straße aufnimmt. Das Regenwasser von den Fallrohren wird zur Innerste geleitet. Wasser aus den Straßenabläufen wird dem Wurzelbereich der Baumscheiben zugeführt. Da der Mischwasserkanal im nördlichen Teil der Ritterstraße Schäden aufweist, werden rund 50 Meter des Kanals erneuert. Im gesamten Projektgebiet werden 110 Hausanschlüsse an den Mischwasserkanal erneuert.

In der Mühlenstraße und in der Straße Alter Markt vom südlichen Ende bis zur Kreuzung Burgstraße wird die EVI Energieversorgung Hildesheim Versorgungsleitungen für Fernwärme, Strom, Gas und Wasser neu- sowie umverlegen und die Stadt Hildesheim wird die Straßen grundhaft ausbauen.


So ist der generelle Bauablauf

Bevor die Tiefbauarbeiten in einem Bauabschnitt beginnen können, wird eine Kampfmittelsondierung im jeweiligen Bereich durchgeführt. Nach dem Aufbruch der Straße werden die neuen Kanalrohre verlegt und die Hausanschlüsse erneuert. Anschließend folgt das Verlegen der Versorgungsleitungen. Am Ende eines Bauabschnitts werden die Oberflächen hergestellt – teilweise bereits als finaler Straßenbau, teilweise zunächst als provisorische Oberflächenbefestigung.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Unter www.stadt-hildesheim.de/newsletter-alter-markt besteht zudem die Möglichkeit, sich für einen Newsletter zum Bauablauf anzumelden.

Geplanter Bauablauf

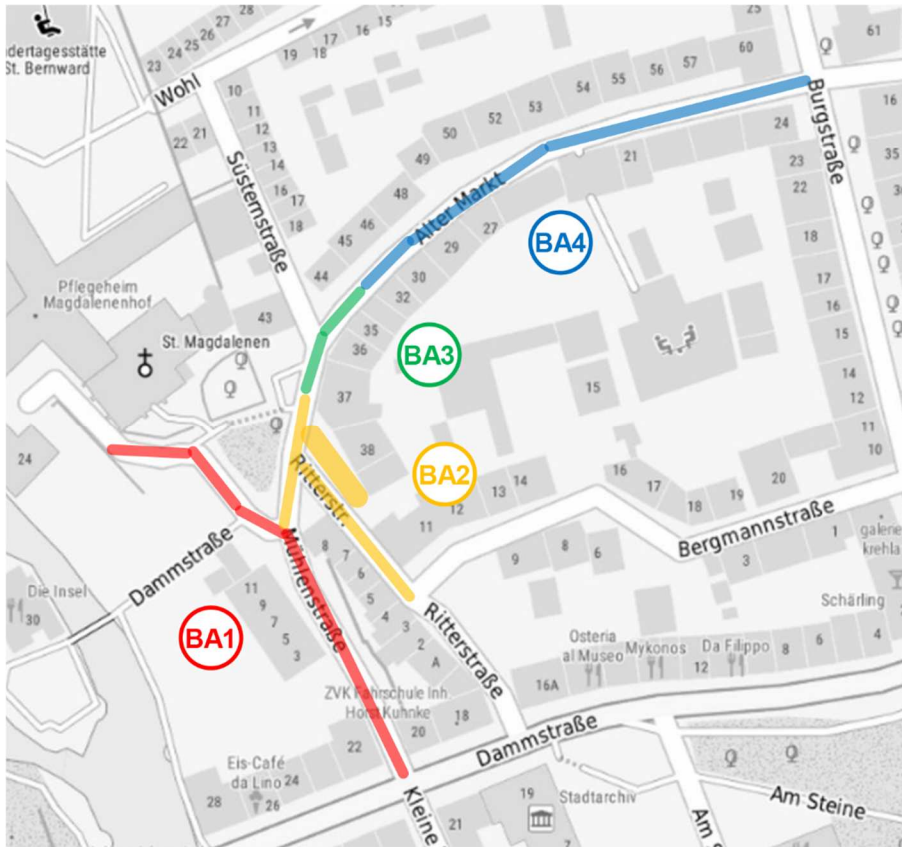

Geodaten © Stadt Hildesheim
